

Cronograma y Tareas del Proyecto

NexaSafe — Roadmap de sprints, hitos y responsables

NEXASAFE

PROGRAMA

Ingeniería de Sistemas

EQUIPO

Juan Felipe Pineda Cardona · Integrante 2 · Integrante 3

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

1.0

INSTITUCIÓN

Fundación Universitaria San Mateo

FECHA DE ENTREGA

22 de septiembre de 2026

PERIODO CUBIERTO

22 sep – 28 nov 2026

1. Introducción

Este documento detalla el cronograma del proyecto NexaSafe para el periodo 2026-2, la asignación de responsables por rol dentro del equipo y las dependencias críticas entre tareas. Es el desglose operativo del roadmap de sprints definido en PLAN_NEXASAFE.md (sección 8), con el nivel de detalle necesario para la asignación de recursos exigida por Ingeniería de Software I.

6

SPRINTS (INCL. SPRINT 0 Y
CIERRE)

68

DÍAS CALENDARIO

≈121

PTS. DE CAPACIDAD
ESTIMADA

≈210

PTS. DEL BACKLOG COMPLETO

2. Cronograma general

Hitos H0-H6 sobre el eje superior · barras = duración de cada sprint

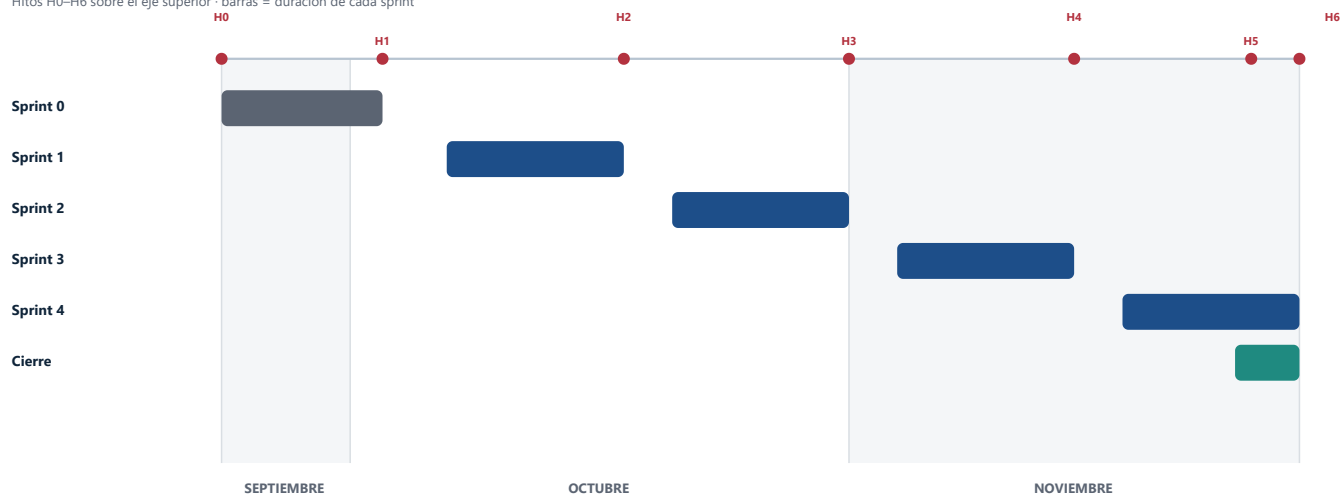


Figura 2.1 — Cronograma general de sprints e hitos, 22 de septiembre a 28 de noviembre de 2026.

3. Hitos

Hito	Fecha	Criterio de cumplimiento
H0	22 sep	Documentación de ingeniería entregada — los cinco documentos exigidos radicados.
H1	2 oct	Pipeline verde — todo PR ejecuta lint + test + SAST + SCA automáticamente.
H2	17 oct	Primer incremento demostrable — alta de usuario funcionando en dispositivo real.
H3	31 oct	Núcleo funcional — trayecto acompañado con ubicación en vivo operando.
H4	14 nov	MVP funcional completo — flujo alerta → notificación → respuesta → cierre completo.
H5	25 nov	Release candidate — build firmado, sin hallazgos High/Critical abiertos.
H6	28 nov	Sustentación — demo en vivo, informe y repositorio entregados.

4. Detalle de tareas por sprint

Responsables asignados por rol funcional dentro del equipo (ver capítulo 3 del Plan de Desarrollo de Software): **Rol Móvil**, **Rol Backend/Datos** y **Rol DevSecOps/QA**. Con un equipo de tres integrantes, cada rol recae en un integrante fijo; el rol de *Security Champion* rota cada dos sprints entre los tres. Si el equipo opera con dos integrantes, los roles Backend/Datos y DevSecOps/QA se combinan en una sola persona.

4.1 Sprint 0 — 22 sep a 2 oct 18 pts

Sprint Goal: la plataforma técnica y de seguridad está lista para producir código auditable.

Historia	Tarea	Responsable	Pts
E0-01	Monorepo con ramas protegidas y plantillas de PR	Rol DevSecOps/QA	3
E0-02	Pipeline de CI: lint, pruebas y build en cada PR	Rol DevSecOps/QA	5
E0-03	SAST, SCA y escaneo de secretos automáticos	Rol DevSecOps/QA (Security Champion)	5
E0-04	Ambientes dev y staging desplegados por pipeline	Rol Backend/Datos	5
—	Modelado de amenazas inicial (STRIDE por épica)	Equipo completo, facilita Security Champion	—

4.2 Sprint 1 — 6 a 17 oct 24 pts

Sprint Goal: un acudiente puede registrarse, dar de alta a un menor y el colegio validarlo.

Historia	Tarea	Responsable	Pts
E1-01	Registro de acudiente con correo y contraseña	Rol Móvil	3
E1-02	Alta de menor y vinculación como guardián	Rol Móvil + Rol Backend/Datos	5
E1-03	Validación de matrícula por el colegio	Rol Backend/Datos	5
E1-04	Ingreso del protegido con PIN corto	Rol Móvil	3
E1-05	Sesión cifrada en el dispositivo	Rol Móvil	3
E11-01	Consentimiento explícito y verificable del acudiente	Rol Backend/Datos + Rol Móvil (UI)	5

4.3 Sprint 2 — 20 a 31 oct 26 pts

Sprint Goal: un guardián puede definir la ruta y seguir en vivo el trayecto del protegido.

Historia	Tarea	Responsable	Pts
E3-01	Definir la ruta casa-colegio sobre un mapa	Rol Móvil	8
E3-02	Configurar corredor de tolerancia en metros	Rol Móvil + Rol Backend/Datos	3
E3-03	Definir duración esperada del trayecto	Rol Móvil	3

E4-01	Iniciar trayecto acompañado con un toque	Rol Móvil	5
E4-04	Indicador permanente de acompañamiento activo	Rol Móvil	2
E2-01	Invitar contactos de apoyo por enlace	Rol Backend/Datos	5

4.4 Sprint 3 — 3 a 14 nov

26 pts

Sprint Goal: el botón de pánico funciona de extremo a extremo con cancelación y modo discreto.

Historia	Tarea	Responsable	Pts
E4-02	Ubicación del protegido en vivo para el guardián	Rol Backend/Datos	8
E4-03	Cierre automático del trayecto por geocerca	Rol Backend/Datos	5
E6-01	Disparo de alerta manteniendo presionado 3 s	Rol Móvil	5
E6-03	Cancelación de alerta con PIN en 10 s	Rol Móvil	3
E6-05	Envío de ubicación cada 5–10 s durante alerta	Rol Backend/Datos	5

4.5 Sprint 4 — 17 a 28 nov

27 pts

Sprint Goal: el puesto de control atiende alertas desde la app y deja bitácora del incidente.

Historia	Tarea	Responsable	Pts
E6-04	Modo discreto de pantalla durante la alerta	Rol Móvil	5
E7-01	Notificación push con sonido prioritario	Rol Backend/Datos	5
E7-02	Marcar "voy en camino"	Rol Móvil	3
E8-01	Vista institucional con alertas activas en mapa	Rol Móvil + Rol Backend/Datos	8
E9-01	Bitácora auditable con marca de tiempo inmutable	Rol Backend/Datos	5
E9-02	Cierre clasificado de la alerta	Rol Móvil	3
E11-04	No compartir ubicación fuera de trayecto/alerta activos	Rol Backend/Datos	3

4.6 Cierre — 24 a 28 nov (solapado)

Sin puntos de historia

Entregable de cierre	Responsable
Release candidate firmado (EAS Build)	Rol DevSecOps/QA
SBOM y reporte consolidado de seguridad	Rol DevSecOps/QA (Security Champion)
Manual de usuario e instalación	Equipo completo
Video demostrativo (5–7 min)	Equipo completo
Informe final y sustentación	Equipo completo

5. Ruta crítica y dependencias

La ruta crítica del proyecto atraviesa la plataforma técnica, la identidad y el flujo de trayecto/alerta, en ese orden. Ninguna épica de negocio puede construirse con controles de seguridad verificables antes de que exista pipeline (E0); ningún trayecto puede acompañarse sin un protegido validado (E1); y la respuesta institucional (E7–E9) depende de que exista una alerta real que atender (E4, E6).



Figura 5.1 — Cadena de dependencias críticas entre épicas (E0 → E1 → E3/E4 → E6 → E7/E8/E9).

Épicas fuera de la ruta crítica del semestre

E5 (detección automática de desvío) y E10 (resiliencia offline completa) dependen de que E3/E4 y E4/E6 estén consolidadas respectivamente; quedan declaradas como **trabajo futuro** por restricción de capacidad (ver capítulo 6).

6. Capacidad y velocidad del equipo

Escenario	Velocidad objetivo	Implicación
Equipo de 3 integrantes	24 pts/sprint	Roles Móvil, Backend/Datos y DevSecOps/QA separados; velocidad recalibrada tras el Sprint 1 con datos reales.
Equipo de 2 integrantes	16–18 pts/sprint	Se combinan los roles Dev y Scrum Master; las historias SHOULD se sacrifican primero.

Brecha de capacidad frente al backlog completo

El backlog completo suma $\approx$ **210 puntos**. La capacidad disponible hasta finales de noviembre, sumando los 5 sprints planificados (18+24+26+26+27), es de $\approx$ **121 puntos**. La diferencia ($\approx$ 89 puntos) se resuelve declarando explícitamente como **trabajo futuro** las épicas y historias de menor prioridad MoSCoW: E5 completa, E10 completa, E2-02, E2-03, E6-02, E6-06, E8-02, E8-03, E9-03, E11-02 y E11-03 (detalle en PLAN_NEXASAFE.md, sección 8, "Fuera del roadmap del semestre").

7. Riesgos de cronograma

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta
R6	Alcance excesivo para el tiempo disponible del semestre.	Alta	Alto	MoSCoW estricto; historias COULD se sacrifican primero; revisión de alcance en el hito H3.
R7	Rotación o baja disponibilidad de un integrante.	Media	Medio	Propiedad colectiva del código, documentación en el repo, sin conocimiento aislado en una persona.
R1	La ubicación en segundo plano se detiene por optimización de batería del fabricante.	Alta	Alto	Investigación temprana en Sprint 2 para no comprometer el hito H3.
